

Planejamento Seinfra - AM-352

Resumo: CT - 069/2022-SEINFRA

Extensão total: 98 km

AVANÇO DA OBRA

41%

Programação 2025

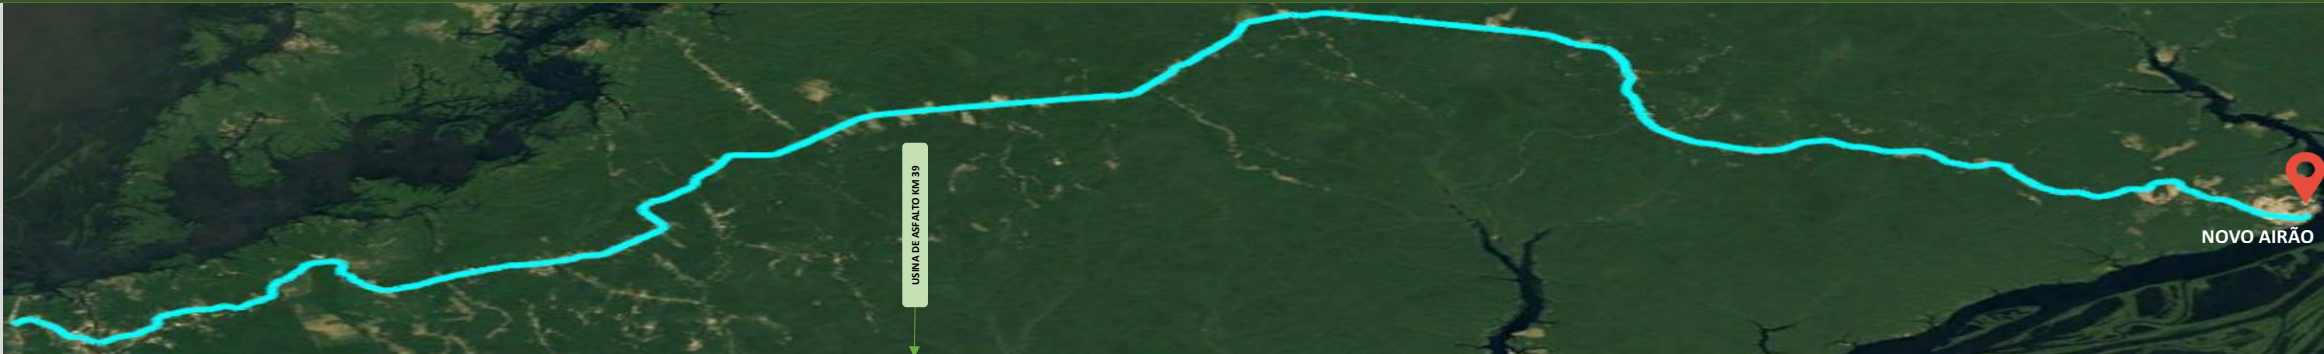
CAPA

30 km

ANO

CAPA ASFÁLTICA

	2023:	20 km
	2024:	20 km
	TOTAIS:	40 km

[illegible]

LEGENDA

- | | |
|--|--------------------|
|  | Concluído |
|  | Em Andamento |
|  | Planejado |
|  | A executar em 2026 |
|  | Não se aplica |

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

Capa Asfáltica: 40 km concluídos

Trecho Novo Airão/Manacapuru - KM 97 ao KM 78

Trecho Manacapuru/Novo Airão - KM 1 ao KM 21

PROGRAMAÇÃO PARA 2025:

Capa Asfáltica: 30 km

Trecho Manacapuru/ Novo Airão - KM 22 ao KM 51

FRENTES DE SERVIÇO:

Secretaria
Executiva Adjunta de
Planejamento

Secretaria de
Infraestrutura



Data Base das Informações:
13/09/2024

Data de Emissão do Relatório:
06/05/2025 REV 30

Elaboração:
Eng^o Raimundo Neto
Supervisão:
Eng^o. Nelcimar Cardoso
Aprovação:
Eng^a. Lizandra Brugnara



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/6441.F29A.1E50.C100/730EAC1C>
 Código verificador: **6441.F29A.1E50.C100** CRC: **730EAC1C**
